

май 2018 года



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

Россия, 398040
г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7 (4742) 44 11 11

Докладчики:

- Лиховозова Галина Александровна
председатель представительства ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области
тел. 8-906-681-29-17,
- Чернышева Виктория Александровна
учитель географии МБОУ гимназии №12 г. Липецка
тел. 8-904-686-02-69

Посади дерево – подари городу чистый воздух

Заказчик проекта: жители города Липецка

Цель презентации: концепция и альтернативы проекта «Посади дерево –
подари городу чистый воздух»



Команда проекта



Лиховозова Г.А.
«Зеленая Россия»
председатель



Тюнина С.В.
МБОУ лицей №3
директор



Чернышева В.А.
МБОУ гимназия №12
учитель




Плотников А.В.
ЛРО ООО
«ОПОРА РОССИИ»
председатель

Цель проекта: Повышение уровня безопасности окружающей среды г. Липецка и формирование у молодого поколения экологической грамотности и практической деятельности в интересах устойчивого развития России путем благоустройства парка «Авиаторов»

Существующее положение:

Парк Авиаторов находится на территории м-на «Елецкий». Проект заключается в планомерном озеленении парковой зоны, создания дендрария, посвященному развитию Липецкого авиацентра. Представительство ОЭОД «Зеленая Россия» выдвинули экологическую инициативу о проектировании озеленения парка, что позволит в системе облагородить это место. В год 100-летия отечественной авиации образовательные учреждения г. Липецка, ВУЗы, колледжи, природоохранные организации совместно с МУП «Зеленхоз» планируют высадить более 2000 деревьев.




Место реализации проекта микрорайон «Елецкий»



Мероприятие «Посади дерево – подари городу чистый воздух»

Место реализации проекта парк «Авиаторов» находится на территории м-на «Елецкий»

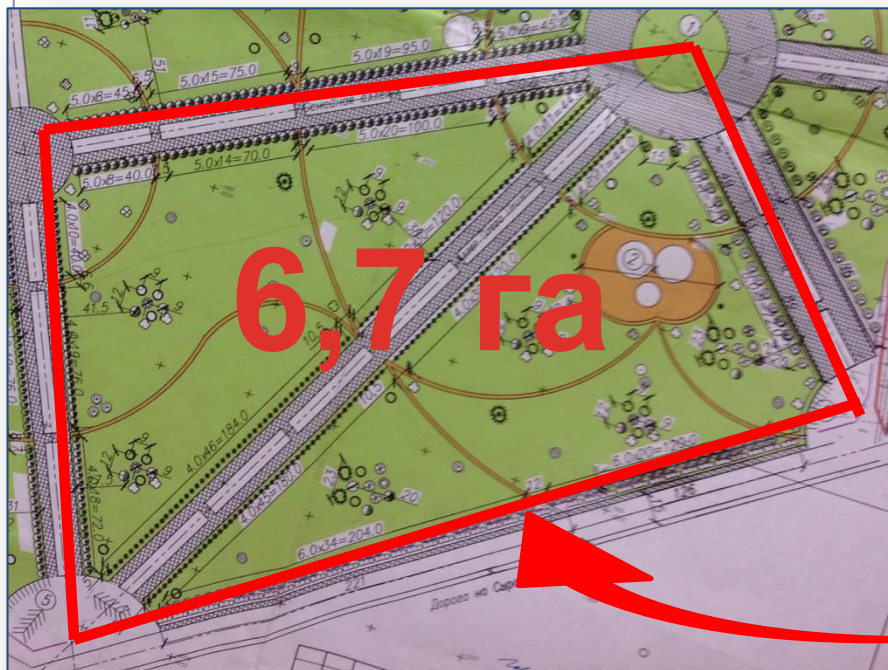

Участники проекта

- Липецкий городской совет депутатов,
- ЛРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России»
- Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»
- ЛРО ВПП «Единая Россия» по Советскому округу,
- Отдел охраны окружающей среды администрации г. Липецка,
- МУП «Зеленхоз»,
- Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Липецка
- Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Липецка,
- Общественная палата г. Липецка,
- ОУ г. Липецка



Концепция и альтернативы проекта (1/N)

Краткое описание содержания проекта:

Данный экологический проект позволит создать условия для развития у учащихся чувства единства и равноправия с природой; включить юных защитников природы в различные виды деятельности по изучению и улучшению местной экологической обстановки, выявить экологические проблемы города, провести максимальное количество природных акций и субботников.

Варианты реализации проекта	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1 (выбранный) Благоустройство парка Авиаторов (озеленение)	Благоустройство, а точнее озеленение парка Авиаторов. Проводится учащимися и педагогами ОУ города Липецка.	Удешевление проекта	Проект не предусматривает такие элементы благоустройства как лавочки, мусорные контейнеры, ампельное озеленение	Парковая зона приобретает финальный облик для дальнейшего благоустройства, формирование экологического сознания у учащихся
Вариант 2 (альтернативный) Благоустройство парка Авиаторов от А до Я	Реализация проекта по благоустройству в полном объеме: обеспечить жителям подъезд, организация пешеходных дорожек с твердым покрытием, зон отдыха (лавочки, урны), создание клумб и т. п.	Парк благоустроен полностью	Дороговизна проекта	Город приобретает полностью благоустроенную парковую зону, формирование экологического сознания у учащихся

Концепция проекта

Устранимые риски/проблемы:

В микрорайоне Елецкий отсутствует зона отдыха для горожан. Зеленые насаждения парков выполняют санитарно-гигиенические функции, являясь барьером. Зеленые насаждения служат прекрасными естественными фильтрами с высокими пылеосаждающими способностями.

Эффект проекта

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее состояние	Целевое состояние*	Отклонение
Благоустройство парка (озеленение)	0	1	1
Проект направлен на формирование у учащихся позитивного экологического опыта при взаимодействии с объектами природы; на организацию учащихся на практическую и природоохранную деятельность; на формирование экологически ответственного мировоззрения, привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы.	0	1	1
Экологическое образование и воспитание молодежи г. Липецка в условиях живой природы родного города	0	1	1

* Применяется цветовая индикация

 - улучшение показателя

 - ухудшение показателя

Бюджет проекта

Формирование стоимости проекта.

Приводятся пояснения по источникам данных, методологии расчета и степени проработки ориентировочной стоимости проекта:

- экспертная оценка выполнена по аналогам (каким);
- Или оценка выполнена проектной организацией (указать проектную организацию) с разработкой предпроектных материалов.

Капитальные затраты приводятся в ценах периода реализации с учетом НДС с разбивкой по статьям: проектно-изыскательские работы (ПИР), основное оборудование (ОО), вспомогательное оборудование, СМР, прочие. Указывается доля (процент) непредвиденных затрат (10%).

Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС и без НДС с разбивкой по статьям и месяцам приводятся в Приложении. При завершении Фазы-1 («Концепция и альтернативы. Оценка и выбор») дополнительно приводится график освоения без НДС с разбивкой по статьям и месяцам.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма собственных средств	Запрашиваемая сумма руб	Итого
1	ПИР (ООО «Архмастер»)	0	55000	55000
2	Саженьцы деревьев - 1300 шт	65000	210000	275000
3	СМР (аренда хозинвентаря, транспорт)	20000	0	20000
4	Прочие с НДС	0	7500	7500
5	Непредвиденные расходы	0	27500	27500
	Итого:	85000	300000	385000

Прогнозируемый график реализации проекта

Задача	Начало	Завершение	2018 год																									
			апрель		май					июнь					июль				август				сентябрь				октябрь	
			16-22	23-31	1-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14
Общая продолжительность	16.04	14.10																										
Благоустройство парка	16.04	14.10																										
Фаза 1. Концепция и альтернатива	16.04	6.05																										
Определение темы проекта	16.04	22.04																										
Определение заказчика	23.04	31.04																										
Предварительное согласование	23.04	31.04																										
Планирование бюджета	1.05	6.05																										
Фаза 2. Оценка и выбор	7.05	15.07																										
Создание проекта	7.05	13.05																										
Подготовка паспорта проекта	7.05	27.05																										
Согласование с заказчиком	21.05	27.05																										
Оформление заказа на посадочный материал	28.05	8.07																										
Уточнение бюджета	28.05	8.07																										
Коррекция проекта	14.05	15.07																										
Фаза 3. Реализация	23.07	23.09																										
Разработка мероприятий на территории парка	23.07	23.09																										
Разбивка территории на деленки	26.08	9.09																										
Высадка растений	3.09	30.09																										
Фаза 4. Завершение и сдача в эксплуатацию	24.09	14.10																										
Сдача заказчику	24.09	14.10																										
Торжественное открытие парка	24.09	14.10																										
Проведение запланированных мероприятий	24.09	14.10																										

Ключевые показатели эффективности проекта

№ п/п	Показатели	Значение показателя*
1.	эффект:	
	<ul style="list-style-type: none"> - формирование у учащихся позитивного экологического опыта при взаимодействии с объектами природы; на организацию учащихся на практическую и природоохранную деятельность; на формирование экологически ответственного мировоззрения, привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы. - экологическое образование и воспитание молодежи г. Липецка в условиях живой природы родного города 	Сформирован экологический опыт и экологически ответственное мировоззрение
2.	Инвестиции в ценах периода реализации,	
	в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - ПИР, тыс. руб. - Основное оборудование , тыс. руб. с НДС - СМР, тыс. руб. с НДС - Прочие, тыс. руб. с НДС - Непредвиденные 	55000 275000 20000 7500 27500
3.	Планируемый ввод в эксплуатацию	Октябрь 2018
4.	Плановый срок завершения проекта (утверждения отчета)	Октябрь 2018
5.	Срок реализации, мес.	4 месяца
6.	Предотвращаемый ущерб:	Появляется новая парковая зона, экологическая ситуация улучшается, жители города становятся более экологически грамотными.

Содержание работ на фазе «Оценка и выбор», «Проектирование и планирование»

- Разработка технического задания на оборудования (ТЗО) на поставку основного оборудования (ОО) – ООО «Архмастер» (май)
 - рассмотрение технико-коммерческих предложений фирм - потенциальных поставщиков инжиниринга и основного оборудования;
 - выбор Поставщика - «Зеленхоз»;
 - уточнение общей стоимости и сроков реализации проекта – май 2018;
 - уточнение показателей эффективности;
 - выбор оптимального варианта реализации.
-
- предлагаемые поставщики: МУП «Зеленхоз»;
 - предлагаемая проектная организация: ООО «Архмастер»;

Предлагаемые решения

- 1. В случае рассмотрения вопроса о завершении Фазы-1 («Концепция и альтернативы»)*
- 2. Признать Фазу-1 («Концепция и альтернативы») завершенной.*
- 3. Согласовать (утвердить) предлагаемую концепцию реализации и целевые КПЭ проекта.*
- 4. Назначить Куратора и Менеджера проекта – председателя представительства ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области Лиховозову Галину Александровну*
- 5. Рекомендовать комиссии включить проект в Программу финансирования из фонда «Зеленый мир».*

Внутреннее согласование

Экспертный совет:

Вице-президент ОТПБЭ

Директор по экологии

Руководитель фонда «Милосердие»

Директор по связям с

Общественностью

Директор проектного управления

Директор по кадрам

Директор по связям с госорганами

Предмет согласования: *концепция,
проект*

Внешнее согласование

- Администрация г. Липецка,
- Отдел охраны окружающей среды администрации г. Липецка,
- МУП «Зеленхоз»,
- Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Липецка
- Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Липецка

